


# Perspectiva de los Laboratorios en la Preparatoria No. 2

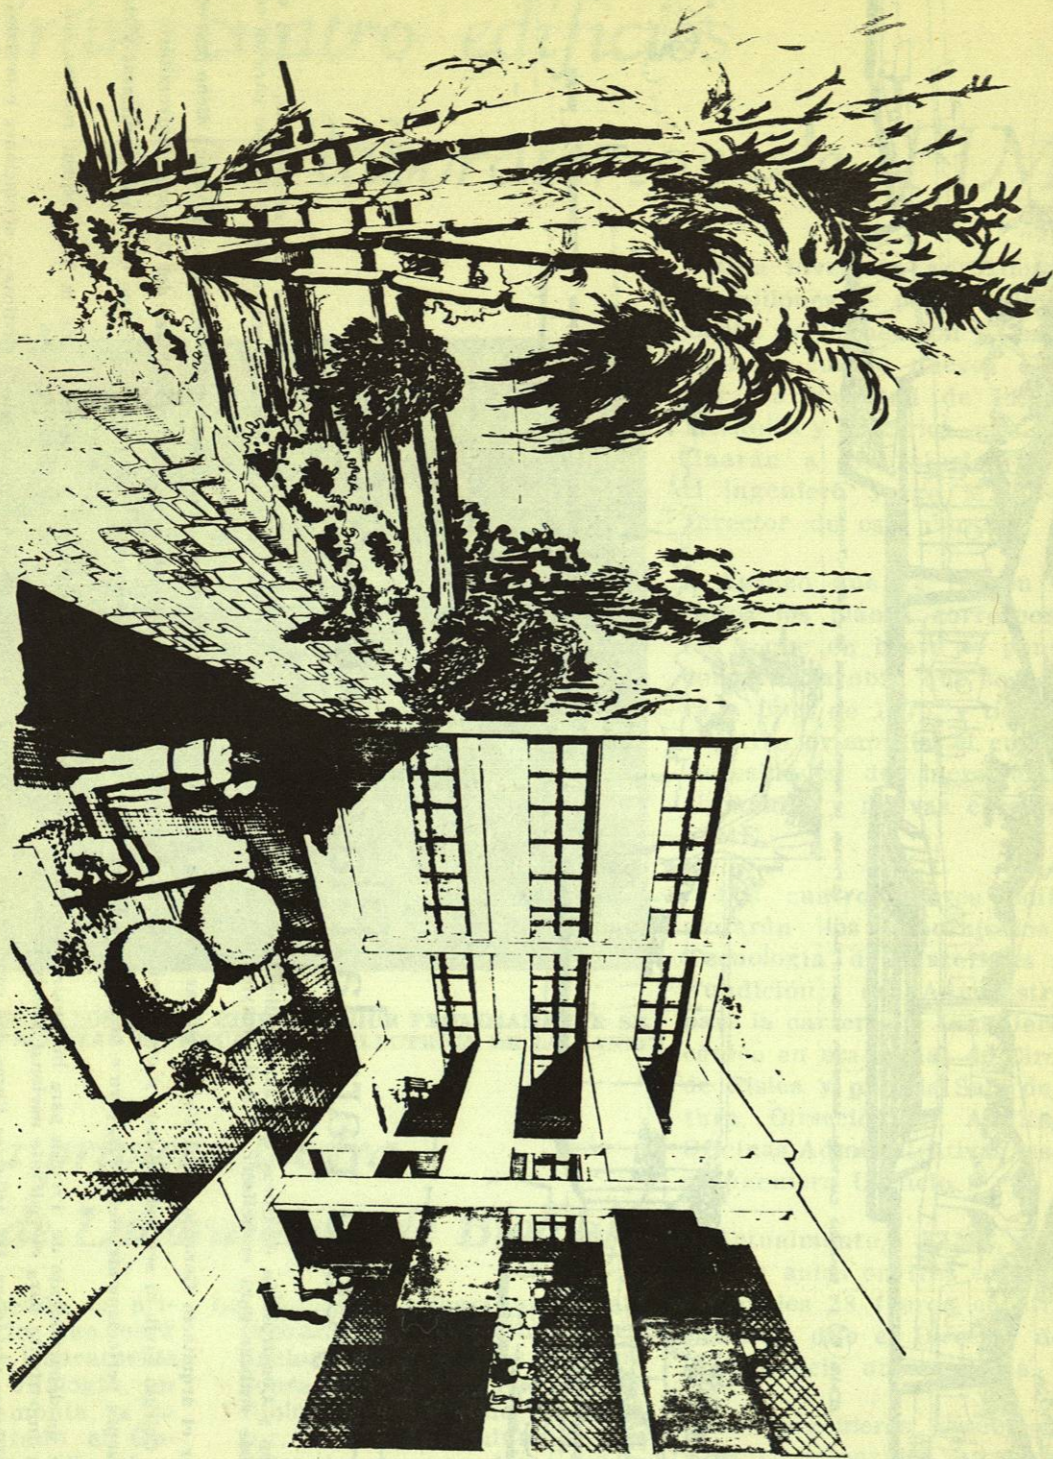

# Avance de las Obras hasta Octubre

El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dr. Luis E. Todd, tiene en su tónica de trabajo realizar obras en beneficio de la comunidad estudiantil, para que en lo futuro existan suficientes escuelas, con el número de aulas requeridas y que la falta de cupo en las escuelas no sea obstáculo para que todo estudiante llegue a ser profesionista.

Para este cometido se encomendó al Departamento de Planeación y Construcción de Obras Nuevas cuyo titular, después de una visita de inspección informó al rector del estado de avance de esta obra.


La primera obra que se inició y que en breve se pondrá en servicio es la de los laboratorios en la Preparatoria Número Dos, cuyo avance en octubre se estimó en un 80 por ciento.

Cabe recalcar que estos trabajos tienen un plazo de terminación hasta el día último del mes de noviembre, pero serán concluidos antes.

Otra obra es la que se lleva a cabo en la Facultad de Psicol-



LA PREPARATORIA No. 2, DONDE SE CONSTRUYEN LABORATORIOS, LA PRIMERA OBRA QUE SE INICIO, SERA PUESTA EN SERVICIO EN FECHA PROXIMA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DR. PEDRO ZORRILLA MARTINEZ.

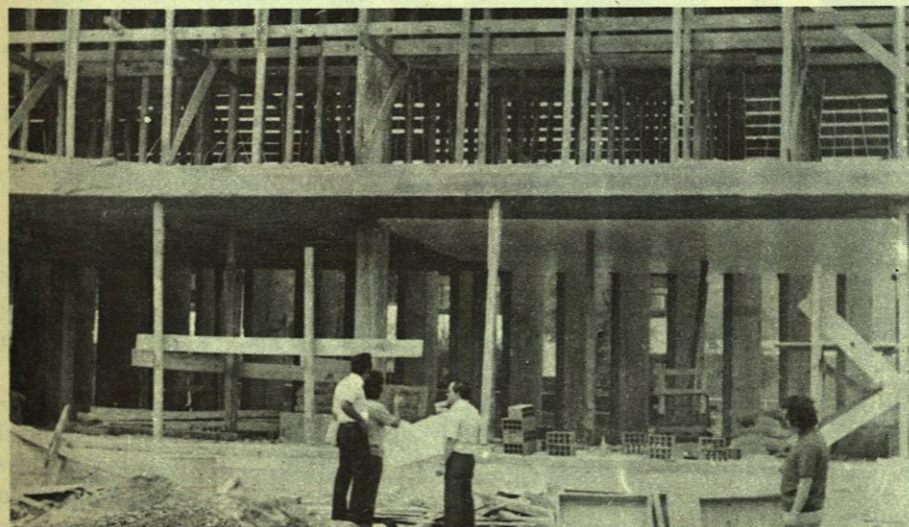

EN LA PREPARATORIA NUMERO 7 TAMBIEN SE CONOCIO EL AVANCE QUE SE TIENE, DESPUES DE HABERSE RETRASADO LOS TRABAJOS DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL.

gía, donde se construye una Clínica de Rehabilitación. Esta obra se inició el 6 de septiembre y se le ha dado un plazo hasta el día 30 de marzo del próximo año para concluiría. Dichos trabajos están a cargo del ingeniero Joel V. González y se tiene un presupuesto de 3 millones 98 mil 200 cuarenta pesos.

En 25 días de trabajo se ha avanzado en un cien por ciento en las excavaciones; 70 por ciento en la cimentación y un 60 por ciento en el acero trabajado, y si continúa en el ritmo que lleva, es posible que estos tra-

(PASA A LA PAGINA 8)



## AVANCE DE...

(VIENE DE LA PAGINA 7)

bajos queden terminados también antes del plazo fijado.

En lo referente a la Facultad de Filosofía y Letras, los trabajos se iniciaron el día 12 de septiembre y están a cargo de la Empresa Constructores y Asociados, dirigidos por el ingeniero Mario Peña Garza.

En esta obra se lleva un cien por ciento en las excavaciones, y se está trabajando con el control de calidad adecuado; a la vez la obra está supervisada por el Laboratorio de Ingeniería Civil donde cabe reconocer la labor de esta Facultad.

Esta obra fue interrumpida por las lluvias y fueron diez días los que estuvo inactiva, pero afortunadamente esto no es motivo para decir que la obra no será terminada en el plazo que tiene.

En la Preparatoria Número Siete, el contratista ha acelerado en un cien por ciento la obra y



LAS OBRAS EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA FUERON SUPERVISADAS POR EL DEPTO. DE PLANEACION Y CONST. DE OBRAS NUEVAS DE LA U. A. N. L.

se piensa acelerarlo un poco más de tal manera que el equipo de acabado el yeso, el mosaico y el azulejo ya está en proceso.

Esto es independiente del segundo piso. Se están tomando providencias para entregar el 50% de esta obra por lo menos en el plazo definitivo, de tal manera que las aulas de la planta baja puedan ponerse a operar de inmediato.



EL ARQUITECTO GERARDO GARZA CORTES, CONOCIENDO EL PLANO DE LO QUE SERAN LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, EN PLENOS TRABAJOS DE CIMENTACION.

En estos trabajos se lleva un pequeño retraso motivado por diferentes factores.

El primero fue la escasez de varilla así como el relleno bajo firmes que fue bastante serio para igualar el nivel del nuevo edificio con el existente.

Posteriormente las lluvias que detuvieron las obras varios días. Aquí en esta obra como en todas las que realiza la UANL a través de la Dirección de Planeación y Construcción de Obras Nuevas se lleva el estricto control de la BITACORA DE OBRA, instrumento indispensable que lleva la historia de todo lo que sucede de todas las decisiones al respecto y todos los cambios, incrementos, deducciones, etc.

Este es de suma importancia, porque además de los aspectos técnicos, sirve para decidir situaciones económicas cuando

o cuando hay trabajos ordenados para adecuar la obra con el edificio o terreno existente. Sirve también como instrumento para determinar la calificación del contratista, si es un trabajo bueno o regular.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS	
FACULTAD DE PSICOLOGIA (clínica)		CORRECCIONES	
TITULO		PROYECTO	
AUTOR		FECHA	
REVISOR		FECHA	
APROBADO		FECHA	
CORRECCIONES		FECHA	
PERSPECTIVA		FECHA	

Así quedará la Clínica en Sicológica



aulas, los anteriores fueron incremento razonable y más o menos constante; pero en 72-73 el déficit motivado por el pase automático, aumentó a 120. El déficit de aulas, en 73-74 fue de 80, sumando un total de 240 hasta 1973, sigue creciendo en 1974 y crecerá en 1975.

Las aulas construídas en ese proceso fueron las siguientes 68-69 se construyeron 29 aulas, en 69-70 no se hizo construcción, lo mismo que 70-71 en 71-72 fueron 55 aulas, entonces la proporción deficitaria se hace más notable.

Es conveniente hacer notar y aclarar un aspecto que con las partidas que se han obtenido del Gobierno Federal, como presupuestos extraordinarios para constructores de ninguna manera, la UANL tendrá cubierto el déficit de aulas y laboratorios. Se tratará de optimizar al máximo estos recursos, subsanando las necesidades más urgentes, pero de ninguna manera, quedarán cubiertas las necesidades a la fecha.

Arquitecto: GERARDO GARZA CORTES.

—oOo—

**INDICADOR**

- RECTOR: DR. LUIS E. TODD
- SECRETARIO GENERAL: LIC. JESUS LOZANO DIAZ
- DIRECTOR DE DIFUSION: LIC. JORGE A. PEDRAZA
- JEFE DE EDITORIAL: HECTOR GONZALEZ Y GONZALEZ
- BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS
- DIRECTOR: ARQ. GERARDO GARZA CORTES
- COMISION TRIPARTITA: POR EL PATRONATO UNIVERSITARIO: DON MANUEL L. BARRAGAN
- POR EL GOBIERNO DEL ESTADO: DR. PEDRO G. ZORRILLA MARTINEZ Y LIC. EDUARDO GARZA GONZALEZ
- POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON: DR. LUIS E. TODD E ING. PABLO MORALES PINAL
- DIRECTOR DEL BOLETIN: ALBERTO GONZALEZ
- Correspondencia: Depto. de Planeación y Construcción de Obras Nuevas, Ser. Piso, Torre de la Rectoría, Ciudad Universitaria de Nuevo León.



EN LA GRAFICA APARECEN LOS ARQUITECTOS HECTOR R. SIERRA, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS DE LA U.A.N.L., GERARDO GARZA CORTES, DIRECTOR DEL MISMO, Y LA LICENCIADA EN DISEÑO LAURA RODRIGUEZ DE NIÑO, OBSERVANDO LA MAQUETA DE LA AMPLIACION DE LA "ESCUELA PABLO LIVAS".

**Ampliarán la Pablo Livas**

La escuela Pablo Livas, de gran tradición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, será remodelada en fecha próxima.

Tripartita, para que la empresa que ofrezca mejor postura sea la que realice esta obra.

En esta sección del proyecto, está programada la ampliación de aulas, área existente y salón de usos múltiples, con un total de mil metros cuadrados. La construcción de esta obra se podrá realizar en un plazo de 6 a 7 meses sin interrumpir el trabajo de la escuela.

Actualmente se encuentra totalmente terminado el trabajo arquitectónico, faltando solamente la etapa de Planos Estructurales, Planos de Instalaciones Sanitarias y Presupuesto.


Se manifestó también que se contempla un estacionamiento dentro de este proyecto y la posibilidad de que el público transeúnte pueda entrar a la escuela para observar el trabajo que ahí se realiza.

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Sergio Salas, dirigido y coordinado por el Depto. de Planeación y Construcción de Obras Nuevas, El Arq. Salas además funge como maestro de dicha escuela. Será presentado a la Comisión Tripartita, para que se programe dentro del conjunto de peticiones.

A la vez por la calle de Jiménez será proyectada una área de exhibición al aire libre. Se buscará una relocalización del busto del maestro Pablo Livas.

Como es costumbre este proyecto se llevará a concurso, después de aprobar la Comisión

En lo futuro se proyecta un Auditorio, con recursos propios, y con el entusiasmo de maestros y alumnos de la escuela Pablo Livas.

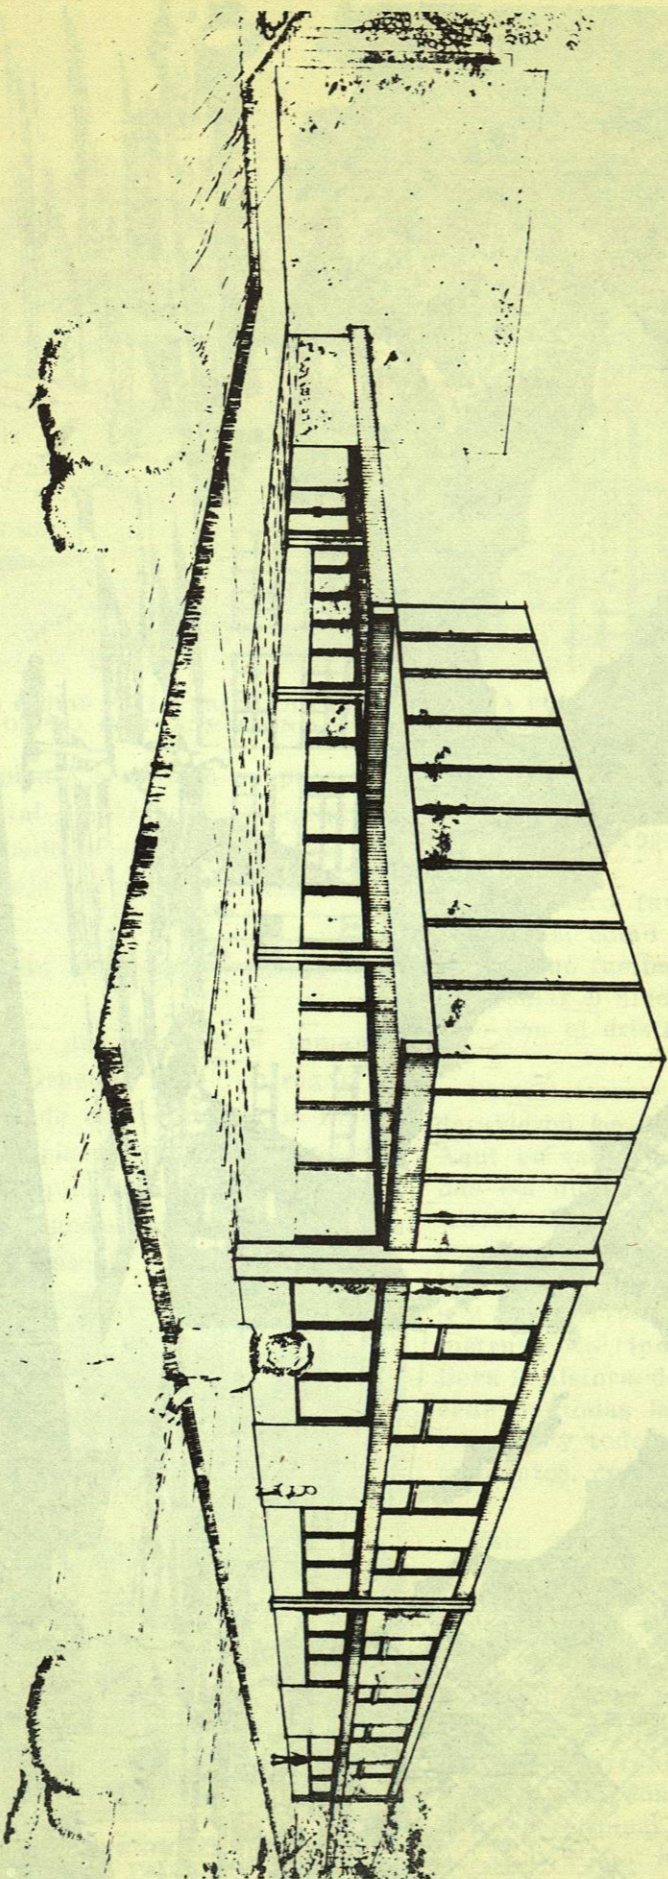

**Realizan proyecto para el Centro de Investigaciones Avanzadas**

De acuerdo con las instrucciones del Rector, Dr. Luis E. Todd, el Departamento de Obras Nuevas de la Universidad, ha realizado un proyecto para el edificio del Centro de Investigaciones Avanzadas.

El Centro de Investigaciones Avanzadas, no tenía una sede propia, es por eso que el Departamento de Obras Nuevas con reducido personal realizó el anteproyecto para incluir este Centro dentro del núcleo de edificios que constituirá la ampliación de la Facultad de C. Químicas.

Este edificio consta de tres plantas, dos se construirán de inmediato. En la primera planta se construirán laboratorios, en la segunda se cuenta una área administrativa y en el tercer piso habrá una ampliación de área preparada para en el futuro construir nuevos laboratorios.

Esta obra tiene un costo aproximado de 1,300,000, aunque no está incluido hasta la fecha dentro de los fondos que autoriza la Comisión Tripartita para la construcción y ampliaciones dentro de la UANL, el Depto. de Obras Nuevas se echó a cuestras el proyecto.

Ahora solamente falta que el Rector dictamine qué fondos se utilizarán para llevar a cabo la construcción. Dentro de este centro se cuenta también con cubículos, para investigadores, biblioteca y una sección de aulas.



# -RESUMEN-

Organismo Informativo del Departamento de Planeación y Construcción de Obras Nuevas


ENERO DE 1952

*Honestidad para lo que se promete  
prometer sólo lo que se pueda cumplir*

BOLETIN RESUMEN NUMERO TRES

Tres obras completamente terminadas y funcionando, una en proceso de construcción, de las cuales la primera obra se terminará en los próximos treinta días y la última recién iniciada, al terminar los siguientes ochenta días. Todo lo anterior con una inversión comprometida superior a los 25 millones de pesos. Tres proyectos terminados, lis-

Arq. GERARDO GARZA CORTES

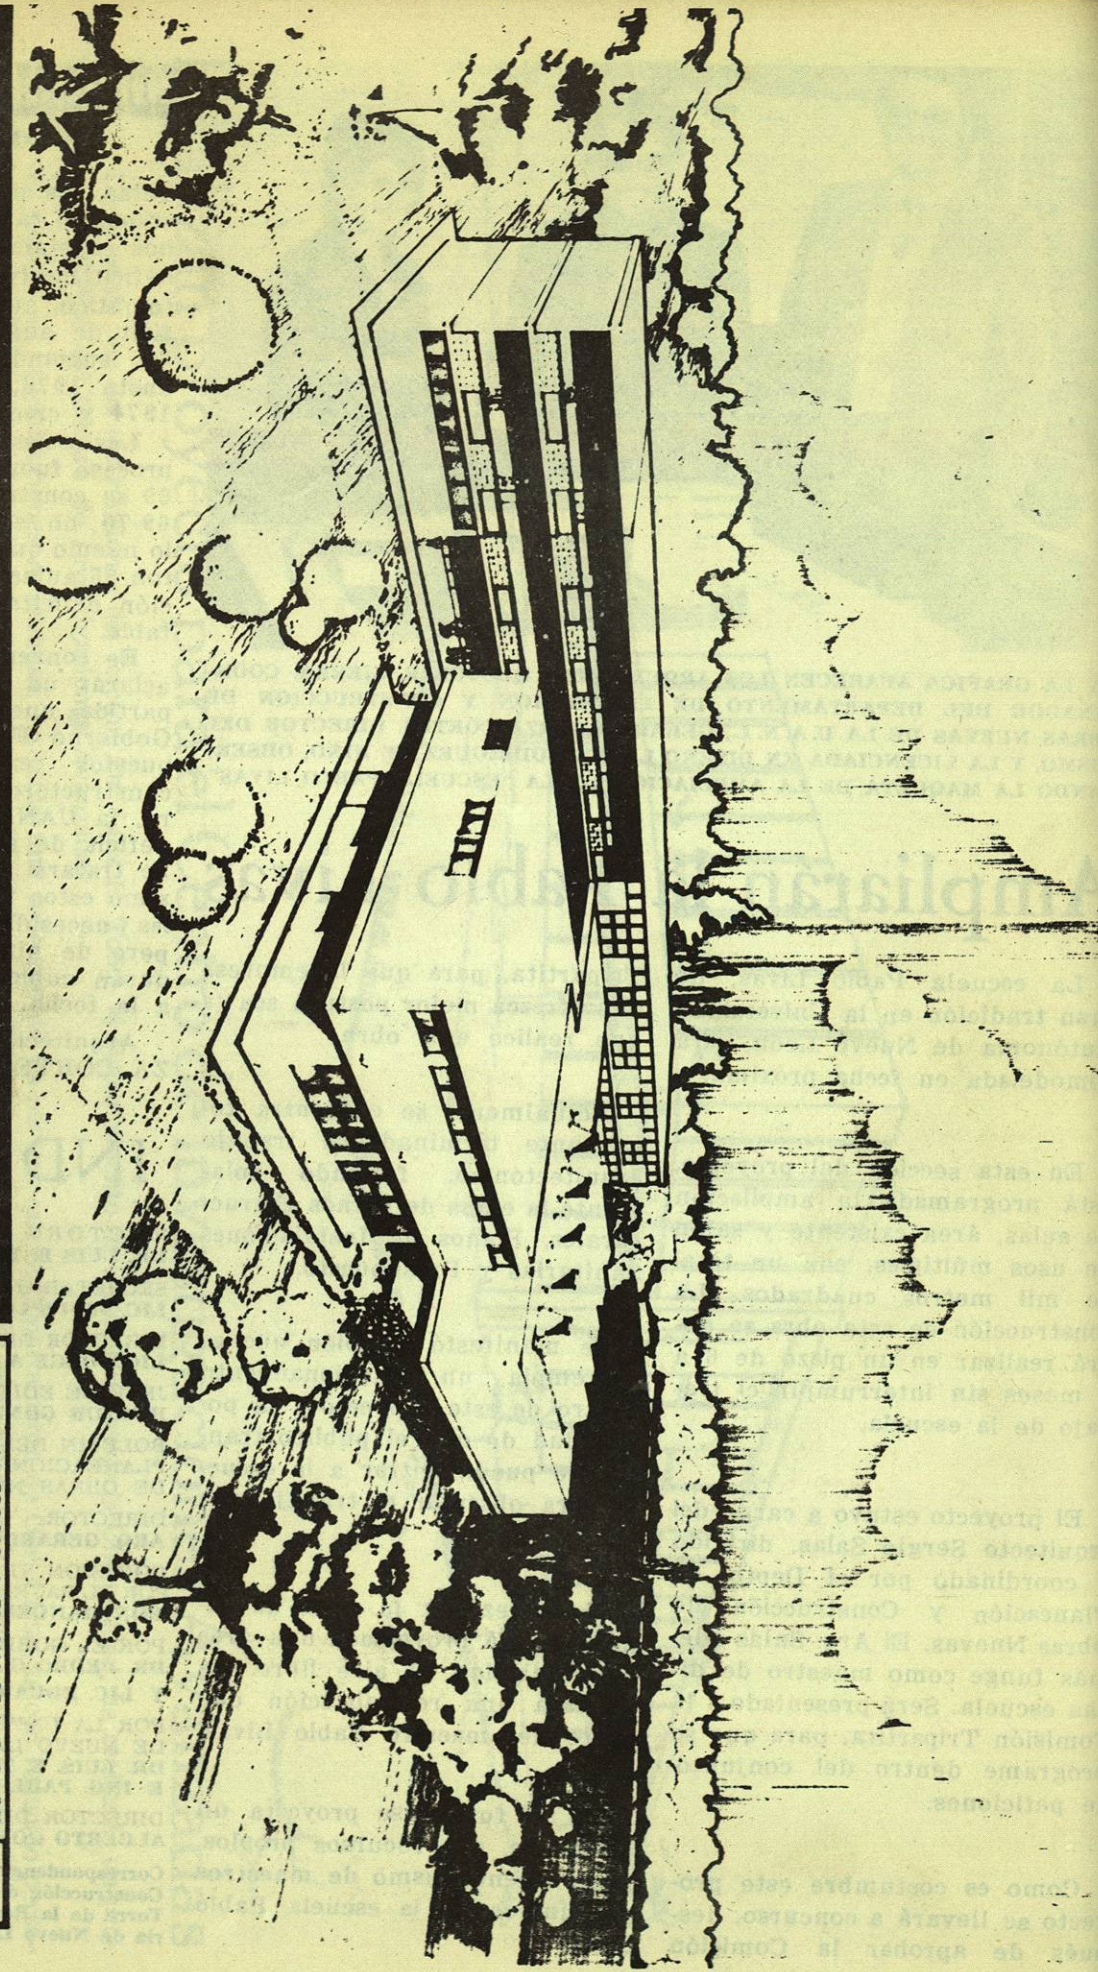

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS  
 FOLIO DE FOLIOS Y PLANOS

PERSPECTIVA

CONSEJEROS

BIBLIOTECA "ALFONSO GALLO"
